

1. PROPOSITO

Estandarizar el proceso de licitaciones para llevar una gestión ordenada, eficiente y efectiva con el fin de cumplir los requisitos y tiempos preestablecidos.

2. ALCANCE

Recepción, preparación, carga de documentos y recupero de pólizas de todas las licitaciones en las que CEDI TECH CONSULTING defina participar.

3. VOCABULARIO

Licitación: Mecanismo legal por el cual empresas u organismos de gobierno adquieren o contratan bienes o servicios. Los interesados presentan propuestas conforme al pliego y se selecciona la más conveniente.

Pliego: Documento que establece las condiciones, requisitos técnicos, legales y comerciales de la licitación, definiendo derechos y obligaciones de las partes.

CRM: Herramienta de gestión utilizada para registrar, hacer seguimiento y almacenar la información de las licitaciones.

Lead: Registro inicial de oportunidad comercial en el CRM asociado a una licitación en análisis.

Opty (Oportunidad): Estado avanzado del lead en el CRM que implica decisión de participar y avance en el proceso comercial.

Acto de apertura: Instancia formal en la que el organismo licitante realiza la apertura de ofertas presentadas y da conocimiento de los participantes.

Preadjudicación: Etapa previa a la adjudicación en la que se define el proveedor con mayor probabilidad de resultar adjudicado, sujeto a validaciones finales.

Adjudicación: Acto formal mediante el cual el cliente selecciona al proveedor ganador de la licitación.

Mantenimiento de oferta: Período durante el cual la propuesta presentada debe mantenerse vigente sin modificaciones y bajo riesgo de penalización en caso de retiro.

Garantía de cumplimiento (póliza): Documento emitido por una aseguradora que respalda el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas en la licitación.

Recupero de póliza: Gestión posterior a la finalización del contrato para solicitar la liberación de la garantía presentada.

Ventana de post apertura: Período entre el acto de apertura y la preadjudicación donde se evalúa la conveniencia de continuar en la licitación.

Ventana de salida: Instancia en la que se analiza la posibilidad de retirarse de la licitación sin penalidades.

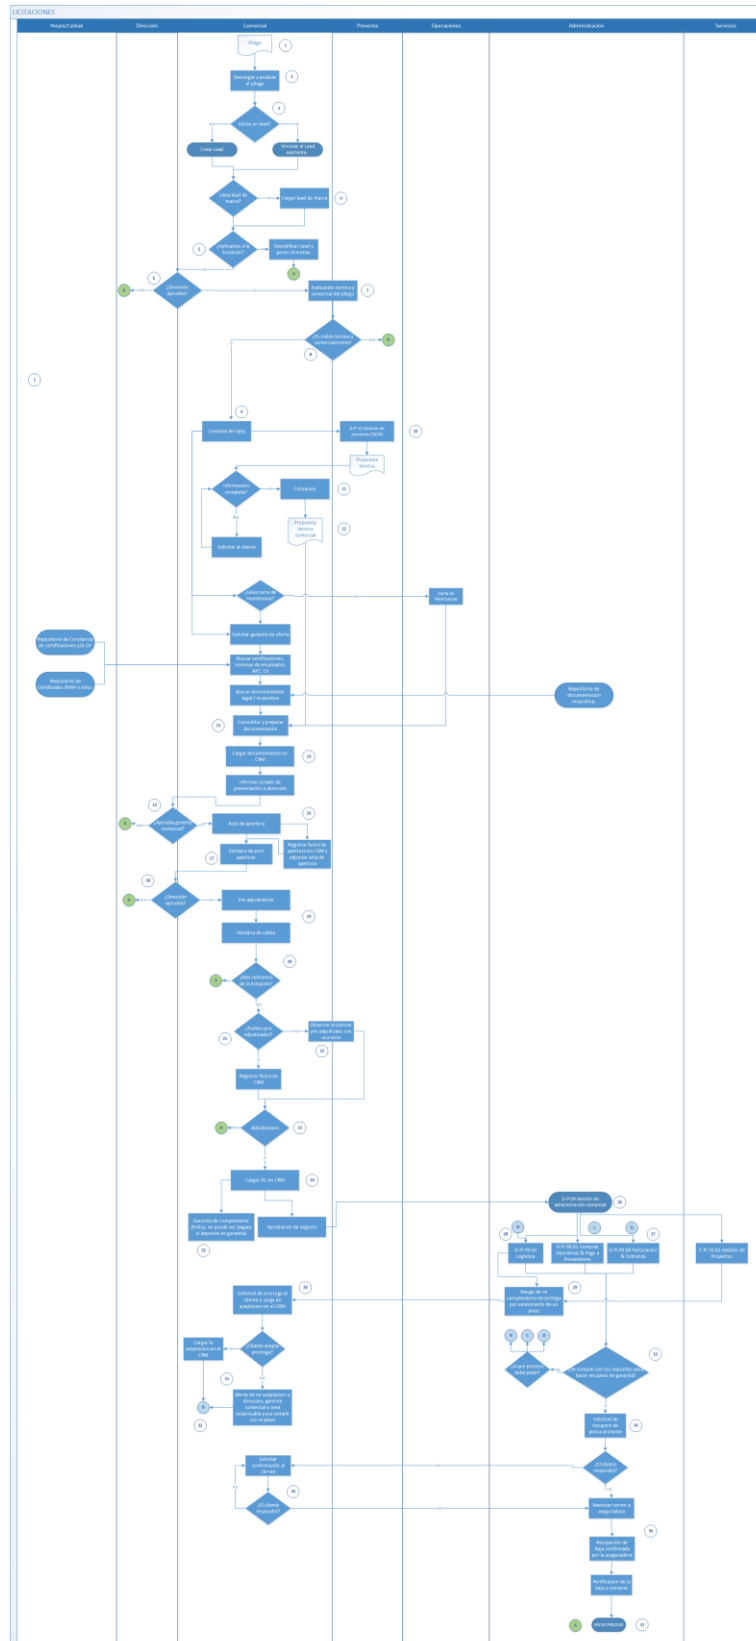
Prórroga: Extensión formal de los plazos establecidos en el pliego, solicitada al cliente y documentada en el CRM.

Evaluación técnica: Análisis de factibilidad técnica realizado por el área de preventa para determinar la capacidad de cumplimiento de los requisitos.

Evaluación comercial: Análisis de condiciones económicas, financieras y estratégicas de la licitación.

4. RESPONSABILIDADES

- **Dirección:** Toma de decisiones para avance del proceso.
- **Gerente comercial:** Velar por el cumplimiento del proceso y toma de decisiones del proceso.
- **Ejecutivo comercial:** Ejecución del proceso según lo definido en el mismo.
- **Líder de preventa:** Velar por el cumplimiento del proceso de preventa.
- **Analista de operaciones:** Garantizar por la disponibilidad de la documentación en tiempo y forma.
- **Líder de administración:** Velar por el cumplimiento de los procesos administrativos.
- **Analista logístico:** Velar por el seguimiento de fechas de lo que requiere en proceso e informar a las áreas correspondientes posible incumplimiento de plazos definidos.
- **People bussines partner:** Garantizar por la disponibilidad de la documentación en tiempo y forma.
- **Líder de calidad:** Garantizar por la disponibilidad de la documentación en tiempo y forma.

5. PROCESO [Link flujograma](#)

N°	Título de la tarea	Descripción de la tarea	Responsable
1	Recepción del pliego	Recepción y descarga del pliego de licitación: El pliego puede ingresar a través de portales de licitación o por correo electrónico a Administración, Ejecutivo Comercial o Dirección. El Ejecutivo es responsable de identificar el pliego e iniciar el proceso.	Ejecutivo Comercial
2	Análisis del pliego	Análisis inicial del pliego para entender alcance, requisitos, plazos y condiciones generales. Se generan las preguntas: - Es renovación automática? - Que riesgos tiene respecto a fecha de entregas, mantenimiento de oferta, moneda, forma de pago, competidores, está escrito para nosotros, tenemos control de la cuenta, apertura, skills propios , etc. - LED de marca En esta instancia se relevan todas las fechas que hay que registrar en CRM. Presupuestos, costos y márgenes	Ejecutivo Comercial
3	Gestión de lead	Verificación de existencia de lead y vinculación o creación de uno nuevo. El título que se registra debe comenzar con la palabra "LICITACION" .	Ejecutivo Comercial
4	Carga de Lead de marca	Se debe cargar el led de marca.	Ejecutivo Comercial
5	Aplica / No aplica	En caso de que el ejecutivo considere no presentarse a la licitación, debe enviar un correo al Gerente Comercial, al Managing Director y en copia al Analista de Operaciones, explicando los motivos para no participar. Hasta que el Gerente Comercial y/o el Managing Director respondan confirmando que no se presentarán a la licitación, se debe continuar trabajando en la gestión de la documentación necesaria según el proceso establecido. Si se aprueba que no se presenten, se debe colocar calificar la Opty como cancelada el motivo por el cual no se presenta.	Ejecutivo Comercial
6	Aprobación de Dirección	Solicitar aprobación a Dirección de la decisión de "aplicar" antes de avanzar. Actualmente con un	Dirección

		correo electrónico a dirección con copia a gerencia comercial, con la información del punto 2. En caso de aprobación avanzar con el punto 7, caso contrario descalificar el lead y colocar el motivo en CRM.	
7	Evaluación técnica y comercial	Evaluación de viabilidad técnica (con Preventa) y comercial del pliego.	Preventa / Ejecutivo Comercial
8	Verificación de viabilidad técnica y comercial	En caso que sea viable, se procede con el punto 8. En caso contrario descalificar el lead y colocar el motivo en CRM	Ejecutivo comercial y líder de preventa
9	Creación de Lead a Opty	Pasar el lead a Opty	Ejecutivo comercial
10	Gestión de preventa	Elaboración de la propuesta técnica. Preventa solicita información al cliente si falta información. Contacto directo con el cliente. INPUT de datos del comercial a la preventa: Apertura, necesidad de prórroga, visitas técnicas. Preventa entrega al ejecutivo comercial la propuesta técnica.	Preventa
11	Cotización	Solicitud y análisis de cotizaciones a proveedores en base a la propuesta técnica.	Ejecutivo Comercial
12	Propuesta técnica-comercial	Consolidación de la propuesta técnica y comercial en un único entregable.	Ejecutivo Comercial
13	Preparación de documentación	Recolección de toda la documentación requerida por el pliego como certificaciones, CV, nómina, ART, documentación legal e impositiva, etc. de las siguientes fuentes: - Documentación People - Administración - CON VENCIMIENTO - Todos los documentos y Administración - SIN VENCIMIENTO - Todos los documentos - CERTIFICADOS - OneDrive - Documentación calidad - Documentación programa de integridad	Ejecutivo Comercial / Administración Contable / Operaciones/ People/Calidad

		En caso de que requiera carta de membresía, solicitar a Operación vía mail. Traducción de certificados:	
14	Carga en CRM	Carga del pliego y documentación y datos relevantes en el CRM.	Ejecutivo Comercial
15	Aprobación del Gerente comercial	El ejecutivo debe notificar al gerente comercial para dar la última verificación de la información. En caso de que apruebe, continuar con el punto 16. En caso de que no, el ejecutivo debe cerrar la Opty como perdida colocando el motivo.	Gerente comercial
16	Acto de apertura y Registro de información en CRM	Seguimiento del acto de apertura e información de estado a Dirección con un correo electrónico. El ejecutivo debe registrar fecha de apertura en CRM y adjuntar acta de apertura.	Ejecutivo Comercial
17	Ventana de post apertura	Instancia de análisis para evaluar continuidad del negocio considerando vencimientos y condiciones comerciales. Ventana de control entre acto de apertura y preadjudicación para evaluar vencimientos, costos y conveniencia de continuar. Entre acto y pre, se consumen el mantenimiento de oferta, momento para salirse sin multa.	Ejecutivo Comercial
18	Aprobación de dirección	El ejecutivo debe notificar a dirección y gerencia comercial. En caso de aprobación se sigue con el punto 19, caso contrario se debe cerrar la Opty como perdida colocando el motivo.	
19	Preadjudicación	Registro de la preadjudicación. Si otro partner es el preadjudicado, se habilita instancia de observación.	Ejecutivo Comercial / Dirección
20	Ventana de salida	En esta instancia se analizan las condiciones nuevamente para decidir si nos retiramos de la licitación o no. Si nos retiramos, se debe cerrar la Opty como perdida colocando el motivo. Caso contrario, se avanza con el punto siguiente.	Ejecutivo Comercial
21	Preadjudicacion	Si fuimos preadjudicados, se registran las fechas en el CRM. En caso contrario, se avanza con el punto 22.	Ejecutivo Comercial

22	Observación a partner	Presentación de observación al partner preadjudicado, volviendo a la preventa para encontrar los grises del otro y seguir en carrera. NUNCA IMPUGNAMOS, en caso de querer hacerlo, requiere aprobación de DIRECCIÓN	Ejecutivo Comercial/ preventa
23	Adjudicación	Confirmación del acto jurídico de adjudicación. Se le da aviso a dirección Actualmente con un correo electrónico dirección con copia a gerencia comercial. En caso de no ser adjudicados se debe cerrar la Opty como perdida colocando el motivo.	Ejecutivo Comercial
24	Carga de Orden de Compra	Carga de la Orden de Compra en CRM y aprobación del negocio. REVISION QUE COINCIDA CON LO OFERTADO	Ejecutivo Comercial
25	Garantía de cumplimiento	Solicitud de la garantía de cumplimiento poniendo en copia a compras (póliza de aseguradora, no pagaré ni depósito). Con el mail a la aseguradora, y a logística. Tenemos 5 días para presentarla. Envié de la garantía al cliente. En caso de que el pliego tenga costo o requiera pago de tasas, el comercial debe cargar una Compra interna. Una vez todo cargado avisar a Gerente comercial para que sea aprobado. Sin esa aprobación, el asistente de tesorería no puede comprar. Debe proceder según G-PI 09.02 Compras No Operativas	Ejecutivo Comercial
26	Validación administrativa	Validación de la información del negocio antes de su creación. Creación formal del negocio en el sistema.	Administración
27	Activación de procesos	Activación de procesos de compras, logística, facturación y cobranza.	Administración / Compras / Logística
28	Seguimiento de ejecución	Seguimiento de entregas de productos y servicios según pliego y OC.	Logística
29	Identificación de riesgo	Identificación de riesgo de no cumplimiento de fechas comprometidas. PRODUCTO Y SERVICIOS	Logística
30	Solicitud de prórroga	Solicitud formal de prórroga al cliente nota, CON COPIA A DIRECCIÓN y carga de la aceptación en CRM.	Ejecutivo Comercial

		Con copia a Logística. ALERTA DE NO ACEPTACION DE PRORROGA, CON MAIL A dirección, gerente comercial y área que debe accionar para garantizar el cumplimiento de los plazos.	
31	Aceptación de prórroga del cliente	Si el cliente acepta la prórroga el ejecutivo debe adjuntar la aceptación en el CRM. Si el cliente no acepta, el ejecutivo debe enviar alerta de no aceptación a dirección, gerente comercial y área responsable para cumplir con el plazo	Ejecutivo Comercial
32	Proceso logístico de seguimiento	LOGISTICA HACE EL SEGUIMEINTO DE COMPLIMIENTO DE SERVICIOS COMO DE ENTREGA DE PRODUCTOS PARCIALES O TOTALES	Logística / Administración
33	Verificación de cumplimiento total	Verificación de entrega, facturación y cobranza completas.	Logística / Administración
34	Recupero de garantía	Solicitud de recupero de la póliza a la aseguradora. Esto sucede cuando se entrega todo y el cliente muestra conformidad formal.	Administración
35	Intervención comercial	Intervención del Ejecutivo si el cliente no responde al recupero.	Ejecutivo Comercial
36	Cierre administrativo	Registro del cierre administrativo del proceso de licitación. Notificación de la baja de póliza a compras	Administración
37	Fin del proceso	Cierre definitivo del proceso de licitaciones.	Administración

